沈錘チェーン交換作業当日要領

OYC ハーバー委員会　2025.6.11

⓪　6 月 15 日(日)沈錘チェーン組立最終確認(ポイントレース後)理事会メンバー。
　6 月 15 日(日)東海マリンさんへ沈錘チェーン海上投入支援依頼(㉛～㊱：6 カ所)。平野
　6 月 20 日(金)駐車禁止貼り紙(図中▲カラーコーン 8 カ所)。平野

①　6 月 21 日(土)7:30 集合(役員＋有志)。

②　フロート/チェーン組立積込み/各バース前下し　名港海事商会トラック＋有志トラック　8 時作業開始

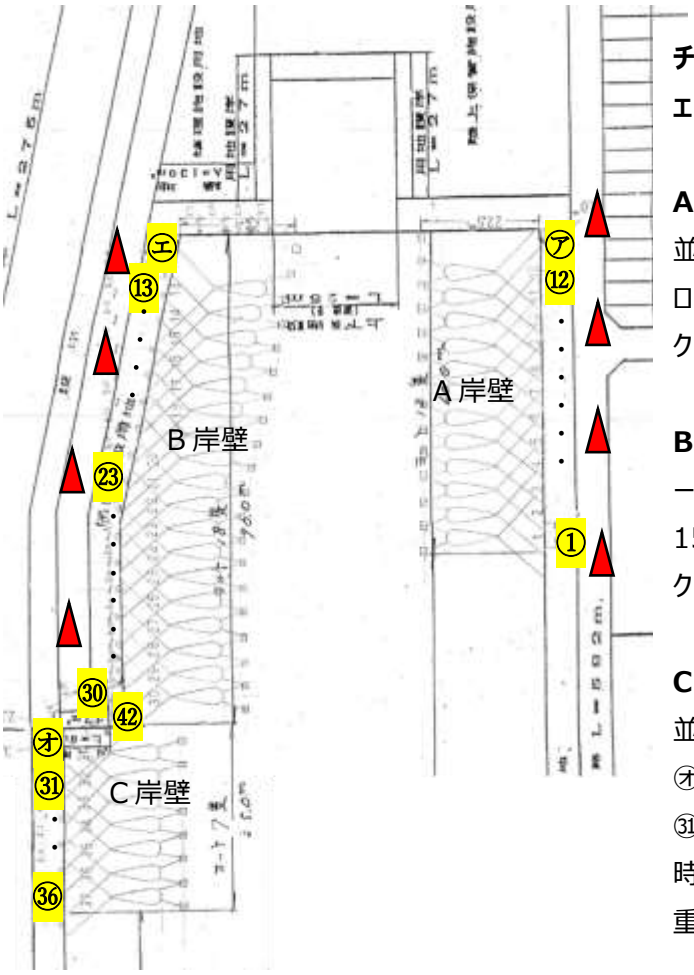

チェーン組立重量:約 35 ㎏/内訳フロート 2.5kg、チェーン 13 ㎜ 8m25kg、19 ㎜ 1m7 ㎏

A 岸壁①～⑫、㋐フロートチェーン組立を各バース前に並べる。(㋑フロートチェーンは倉庫保管:沈錘 14 番フロートチェーンなし。)
クレーン車設置・海上投入

B 岸壁㋓、⑬～㉓～㉚、㊷フロートチェーン組立を各バース前に並べる。(㋒フロートチェーンは倉庫保管:沈錘 15 番フロートチェーンなし)
クレーン車移動設置・海上投入

C 岸壁㋔、㉛～㊱フロートチェーン組立を各バース前に並べる。
㋔はクレーンで海上投入。
㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱は東海マリンにお願いする。
時間は 13 時以降で調整し当日作業進捗にて連絡。
重量 35kg であり、1 個づつ運ぶ。2 人作業。

③　新フロートチェーンへ舫い付け替え作業、旧フロート取外し(基本各バース南側)は **6 月 22 日(日)のハーバー作業終了後以降、各艇オーナーが責任をもって実施してください。**旧フロート取外しは、**隣の艇の舫いロープが付いていない事を確認し**実施してください。天候が比較的安定している **7 月中旬までには交換作業完了**するようお願いします。

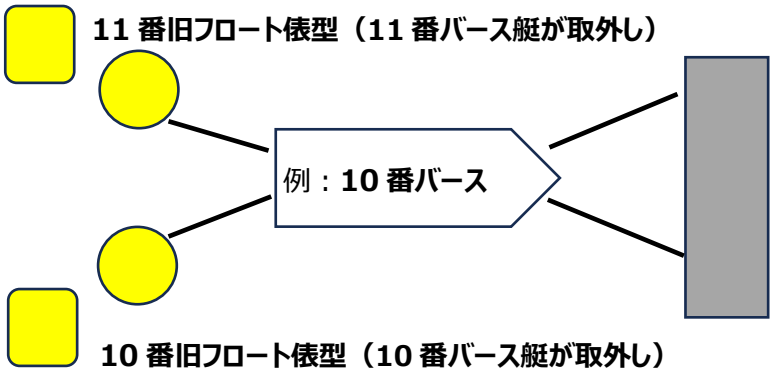

申し訳ありませんが**各岸壁最北バース艇(Perky Peter/ﾐｽﾄﾗﾙⅣ/蓮真さん)は北側旧フロートの取外し/持ち帰りもお願いいたします。**
1 番バース南側は ISE-V が取外し/持ち帰りいたします。

旧フロートは各艇かならず持ち帰って適切に処分または再利用してください。
